



COMPTE-RENDU DE REUNION N°19

Du Lundi 23 Avril 2018

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

Intervenants	Responsables	Téléphone Courriel	P : Présent A : Absent E : Excusé	Convité prochaine réunion
Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE	M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND	T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr	P P	X X
Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9	Julien LAURENT Olivier CANAT	T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr	E P	X
Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD	M. OUGER M. POULET	T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr	E E	X X
Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02	Jérémy PIQUET	T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr	P	X
Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY	Michel PHILIPPE	P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com	E	X
Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex	Hugues Barbier	T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr	E	X
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ	Thibault RACHER	T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr	E	X
DITAM - VEZELISE	M.DESOUSA	pdesousa@departement54.fr	E	X

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- La pose des géomembranes sur les deux étages est terminée.



Planning

- STPI :
 - **Semaine 20** :
 - Réalisation des travaux de finitions avant les réfections de fouilles et de chaussées sur l'ensemble des travaux,
 - Mise en service du poste de refoulement,
 - Réfections de fouilles et de chaussées sur l'ensemble des travaux,
- SADE :
 - **Semaine 17** :
 - Essais d'étanchéité,
 - Pose des réseaux internes,
 - Remplissage des bassins.

Action à mener

- **E.V.I.** :
 - E.V.I. informe les entreprises qu'aucune intervention de sous-traitant ne sera possible avant que celui-ci soit accepté par la Commune.
- **Commune de Vaudeville** :
 - La commune de Vaudeville prendra un arrêté de circulation et de stationnement sur tout le village pour la semaine 20. Celle-ci veillera également à prévenir les riverains afin de ne pas bloquer les préparations et réfections de chaussée.

- **Lot N°1 STPI :**

- Suite à la demande de la Commune STPI réalisera une plateforme en GNT le long de la place devant le cimetière.




- Rappel :

- Suite à la demande de la Commune, STPI réalisera les reprises suivantes comme vu en réunion :
 - La reprise de la fouille devant le n°15 Rue de Villers sera réaliser en bicouche,
 - Le Carrefour avec la ruelle des Chenevières sera repris en bicouche sur environ 3 ml,
 - La place de l'Eglise sera reprise en bicouche pleine largeur jusqu'au niveau de l'habitation n°9 (Grille),
 - Au niveau du n°4 Rue de l'Eglise, l'accotement de la rue sera repris en calcaire sur une bande d'un mètre de large,
 - Devant la Mairie, la fouille sera reprise en bicouche,
 - Au niveau du n°22 Rue de Lebeuville l'entrée riveraine et l'apport du pont seront repris en bicouche,
 - Dans la rue des Clérons, la reprise de voirie se fera jusqu'à la délimitation avec l'enrobé, les deux grilles existantes seront remises à niveau,
 - Dans la Ruelle des Gondals, la fouille sera reprise en enrobés,
- **EVI demande à STPI de lui transmettre une projection du décompte final du chantier.**

- **Lot N°2 SADE :**

- Rappel :

- Comme demandé par la Commune, la SADE fournira et installera la barrière pour le parc de l'agriculteur. Il s'agit d'une barrière amovible et réglable à 5 barreaux (dimensions Ar 4.61 ml / Av 1,86 ml) y compris poteaux d'ancrage à sceller suivant les références ci-dessous.

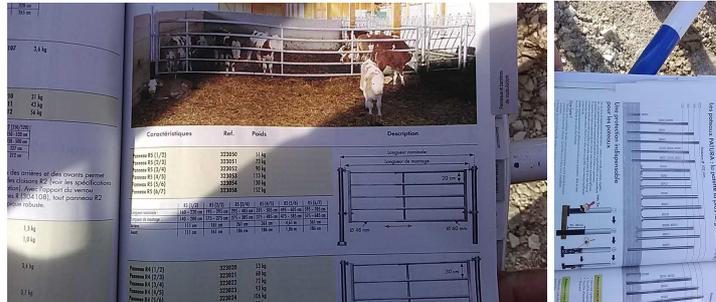

- SADE viendra reprendre le talus entre les deux bassins afin de diminuer la pente de celui-ci.
- Suite à la demande de l'agriculteur propriétaire du terrain à côté de la station, SADE viendra placer le réseau d'évacuation des eaux entre le troisième et le quatrième poteau de la clôture agricole (un piquetage sera réalisé par l'agriculteur).
- EVI rappelle à SADE qu'une attention particulière sera portée aux points d'arrêts suivants :
 - Etanchéité de la bache à contrôler avant et après le remplissage des lits,
 - Mesures de la surface des lits une fois le terrassement terminé,
 - Réalisation d'une analyse granulométrique en carrière et à l'arrivée des camions.

Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Sans objet.

Contrôles de conformité

- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 14 Mai 2018 à 9h30 sur le chantier de la STEP

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Lailhorc - BP 31087

88052 EPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: ev88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.

Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I

Date de diffusion : 23/04/2018
