



COMPTE-RENDU DE REUNION N°8

Du Lundi 11 décembre 2017

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

Intervenants	Responsables	Téléphone Courriel	P : Présent A : Absent E : Excusé	Convié prochaine réunion
Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE	M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND	T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr	P P	X X
Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9	Julien LAURENT Olivier CANAT	T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr	E P	X
Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD	M. OUGER M. POULET	T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr	P P	X X
Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02	Jérémy PIQUET	T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr	E	X
Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY	Michel PHILIPPE	P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com	E	X
Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex	Hugues Barbier	T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr	E	X
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ	Thibault RACHER	T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr	E	X
DITAM - VEZELISE	M.DESOUSA	pdesousa@departement54.fr	E	X

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- La pose du réseau rue de Leubeville vers la Mairie est terminée.



- STPI a poursuivi la pose du réseau gravitaire et des branchements rue de Villers.




Planning

- STPI :
 - **Semaine 50** :
 - Poursuite et fin de la pose du réseau et des branchements rue de Villers.
 - **Semaine 51** :
 - Le 19/12, livraison et mise en place du poste de refoulement,
 - Remise en état des fouilles sur l'ensemble de la Commune
 - **Semaines 52, 1 et 2** :
 - Congés annuels de l'entreprise.
 - **2018** :
 - Reprise de la pose du réseau de refoulement sous RD,
 - Raccordement des différentes antennes existantes sur le nouveau réseau,
 - Mise en service du poste de refoulement,
 - Réfections de fouilles et de chaussées sur l'ensemble des travaux,
- SADE :
 - Le démarrage des travaux est prévu début 2018 sauf conditions climatiques défavorables.

Action à mener

- **E.V.I. :**
 - E.V.I. rappelle que les travaux ne pourront débuter qu'une fois les demandes d'agrément des matériaux et des équipements validés ainsi que les plans d'exécution.
 - E.V.I. informe les entreprises qu'aucune intervention de sous-traitant ne sera possible avant que celui-ci soit accepté par la Commune.
- **Commune de Vaudeville :**
 - Le maître d'ouvrage confirmera la pose et/ou le positionnement des boîtes de branchements suivantes rue de Villers :
 - Habitation en rénovation, boîte en axe de l'ancienne porte de grange

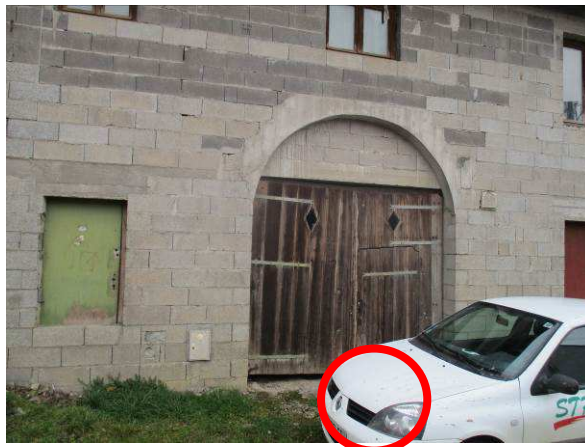

- Pose d'une seconde boîte à la demande du propriétaire au niveau de l'ancienne écurie.



- Pose d'une boîte à la demande du propriétaire au niveau de la maison en ruine



- **Lot N°1 STPI :**

- STPI réalisera un balayage de la zone de la décharge ainsi que les zones de chantier demandées par la Commune.
- Rappel :
 - En accord avec le propriétaire et le maître d'ouvrage, le branchement du N°22 route de Lebeville (M.et Mme DIGNIEL) sera réalisé depuis le réseau du chemin des Clérons. Le propriétaire a débarrassé les lieux des futurs travaux.
 - STPI fera signer par chaque propriétaire l'enquête de branchement déterminant le positionnement de leur boîte de branchement
 - EVI rappelle à STPI qu'il n'est prévu que de poser une boîte de branchement unique pour chaque habitation. Il sera étudié au cas par cas s'il s'avère nécessaire de mettre en place une boîte supplémentaire pour faciliter le raccordement de certaine propriété. Les boîtes de branchement particulières doivent impérativement être posées sous le domaine public et si possible hors usoir. Une amorce en pvc de 160 sera réalisée pour chaque habitation pour éviter au privé d'intervenir sous domaine public et pour faciliter leur raccordement en passant les obstacles présent (murette, haie, bordure, etc.)

- **Lot N°2 SADE :**

- Rappel :
 - SADE transmettra pour validation à E.V.I. :
 - Les récépissés des demandes de DICT.
 - Les fiches d'agrément des matériaux et matériels.
 - Un planning d'exécution avec un phasage détaillé.
 - Les plans d'exécution.
 - EVI rappelle à SADE qu'une attention particulière sera portée aux points d'arrêts suivants :

- Etanchéité de la bâche à contrôler avant et après le remplissage des lits,
 - Mesures de la surface des lits une fois le terrassement terminé,
 - Réalisation d'une analyse granulométrique en carrière et à l'arrivée des camions.
- SADE organisera un constat d'huissier sur le secteur concerné par les travaux de la STEP (chemin d'accès, clôture des riverains, etc.)

Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Le maître d'ouvrage a pris toutes les dispositions pour déplacer l'arrêt de bus scolaire.
- STPI a mis en place les panneaux « Route Barrée » et l'arrêté de circulation est affiché.
- Le maître d'ouvrage a fait le choix de ne pas nommer de CSPS pour l'opération.

Contrôles de conformité

- L'entreprise retenue pour réaliser les contrôles de conformité est l'entreprise Malézieux représentée par M. PHILIPPE Michel
- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 18 Décembre 2017 à 9h30 sur le chantier

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Caillon BP 31087

88057 EPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: es88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.

Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I

Date de diffusion : 11/12/2017
